



ACTA DE SPRINT REVIEW

Proyecto Flety · Sprint 3

Proyecto	Flety
Sprint	Sprint 3
Fecha	04/05/2026
Duracion del sprint	2 semanas
Equipo	Alquilatec s.a.s
Responsable de la presentacion	Nicolas rodriguez quintero

Documento base para la entrega y sustentacion del Sprint 3 del MVP tipo PWA.

1. Objetivo del Sprint

Implementar el modulo de rutas y visualizacion en mapa de Flety, permitiendo que los transportistas publiquen rutas disponibles y que el MVP avance hacia la consulta de trayectos por parte de los usuarios.

2. Alcance comprometido para el Sprint 3

De acuerdo con la planificacion del proyecto, para este sprint se definieron como entregables principales:

- Gestion de rutas
- Publicacion de rutas por parte del transportista
- Visualizacion de rutas en mapa

3. Trabajo realizado

3.1 Gestion y publicacion de rutas

Se avanza en la base funcional para que el transportista pueda crear y consultar rutas disponibles dentro de la plataforma.

- Definicion de campos principales: origen, destino, fecha, horario y capacidad disponible.
- Flujo inicial para publicar rutas de retorno desde el perfil transportista.
- Integracion de rutas con el usuario y rol transportista.

3.2 Visualizacion en mapa

Se desarrollo la base de visualizacion geografica para identificar trayectos disponibles dentro del sistema.

3.3 Ajustes funcionales solicitados

Durante la revision se recibio retroalimentacion para fortalecer el modulo de rutas antes de continuar con solicitudes y confirmacion.

- Diferenciar rutas en el mapa mediante distintos colores para el transportista.
- Incluir lista de ciudades y departamentos para origen y destino.
- Crear cierre o completado de rutas y evitar nuevas publicaciones cuando exista una ruta activa en el mismo horario.

4. Entregables presentados en la Sprint Review

Entregable	Estado	Observacion
Modulo de rutas	Completado con cambios	Base funcional para crear y consultar rutas.
Publicacion de rutas	Completado con cambios	Flujo inicial para registrar rutas disponibles.
Visualizacion en mapa	Completado con cambios	Se solicita diferenciar rutas con colores.
Lista de ciudades y departamentos	Pendiente de ajuste	Incorporar listas para origen y destino.
Control de rutas activas	Pendiente de ajuste	Validar cierre de rutas y horarios activos.

5. Hallazgos y retroalimentación

- Se avanza en el módulo de rutas como componente central del MVP.
- La visualización en mapa permite validar la consulta inicial de trayectos.
- La retroalimentación mejora la claridad visual y el control operativo del transportista.
- El sprint queda aceptado con cambios para estabilizar el módulo antes del Sprint 4.


6. Pendientes para el siguiente sprint

Para el Sprint 4 se proyecta avanzar en solicitudes y confirmación del servicio, incorporando los ajustes de colores por ruta, ciudades y departamentos, cierre de rutas y validación de horarios activos.

7. Conclusiones

El Sprint 3 permitió avanzar en la gestión de rutas y su visualización en mapa, cumpliendo el alcance general definido para esta etapa. El incremento fue aceptado con cambios, debido a mejoras necesarias para fortalecer la experiencia del transportista y evitar cruces de horarios.

8. Anexos de reunión

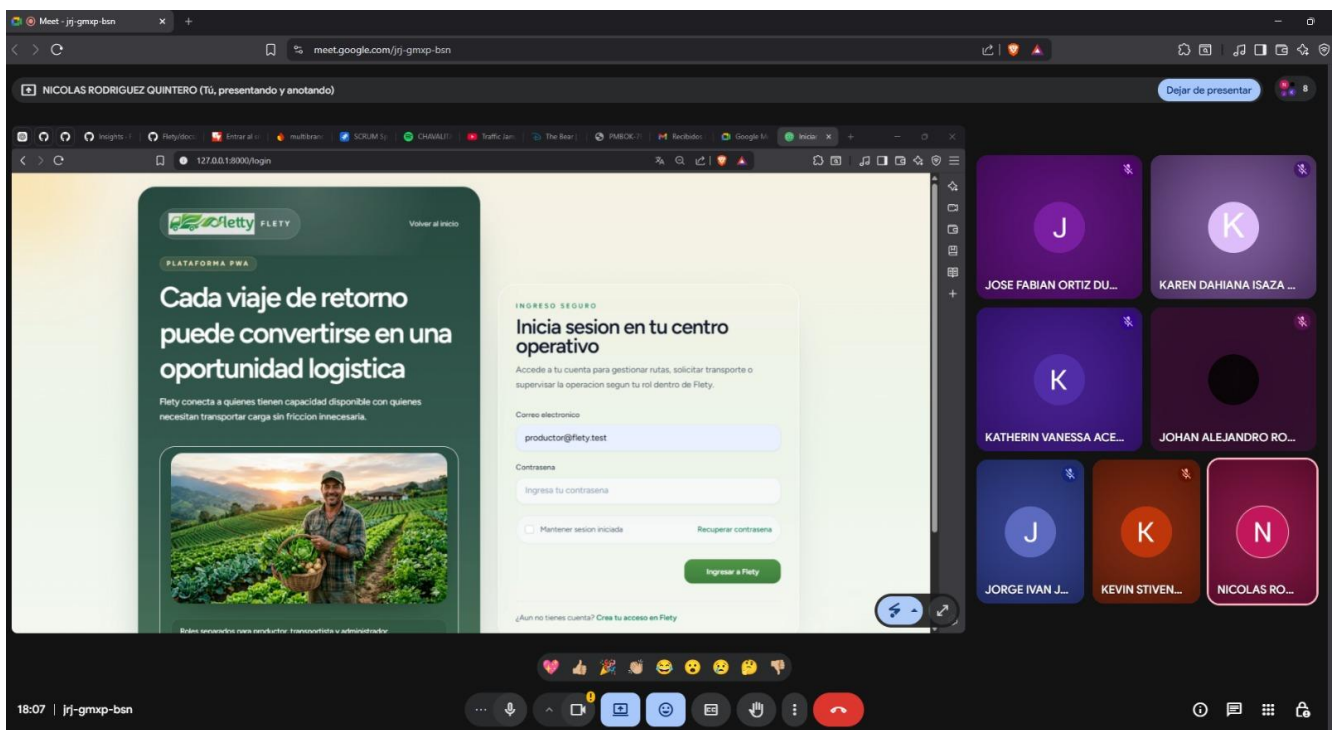

Historial de asistencia

Nombre	Apellido	Correo electrónico	Duración	Hora a la que se unió	Hora a la que salió	
KATHERIN VANESSA	ACEVEDO REYES	katherin.acevedo@correounivalle.edu.co	40 min	17:59	18:39	
KAREN DAHIANA	ISAZA FRANCO	karen.isaza@correounivalle.edu.co	40 min	17:59	18:39	
JORGE IVAN	JARAMILLO BETANCOURT	jorge.ivan.jaramillo@correounivalle.edu.co	39 min	18:00	18:39	
JOSE FABIAN	ORTIZ DUQUE	jose.fabian.ortiz@correounivalle.edu.co	40 min	17:59	18:39	
KEVIN STIVEN	RESTREPO LOPEZ	kevin.restrepo@correounivalle.edu.co	37 min	18:02	18:39	
KEINER ALEJANDRO	RIVAS CHICA	keiner.rivas@correounivalle.edu.co	22 min	18:16	18:39	
JOHAN ALEJANDRO	RODRIGUEZ CARDONA	johan.alejandro.rodriguez@correounivalle.edu.co	17 min	17:59	18:16	
NICOLAS	RODRIGUEZ QUINTERO	nicolas.rodriguez.quintero@correounivalle.edu.co	40 min	17:58	18:39	
JUAN ESTEBAN	VERGARA RESTREPO	juan.vergara.restrepo@correounivalle.edu.co	6 min	18:08	18:14	

9. Aprobación del Sprint

Estado del sprint	aceptado con cambios
Observaciones finales	Aceptado con cambios. Ajustar colores de rutas, ciudades y departamentos, cierre de rutas y validación de horarios activos.
Fecha de cierre	04/05/2026

+

Nicolas Rodriguez Quintero

Jorge Ivan Jaramillo

Juan Esteban Vergara Restrepo
